

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.2890 - 216.2891
Fax (03) 238.8665

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.8182
Fax (02) 230.8008

S.M. Leenwe
09/8824834

STROOMLEVERANCIER:

Ref.:

Teller nr.:

Index:

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.: ST/5130

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

Reepstr 672
BRANKE

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW OF IK:

Datum van het onderzoek:

21/09/95

Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.B. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen:

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 2x230 V

Bescherming van de aansluiting

Voedingskabel hoofdbord:

4 x 10 mm²

Alg. schakelaar: type

Type van de aardelektrode: lus - baren - penen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 10

; RA: 1,7 Ohm; RI tot 50 MOhm

BESCHRIJVING:

zie tenor. schema

INTERGEM - ELECTRABEL
Stationsplein nr 23
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. 054/43.02.11
Fax. 054/41.89.63

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Geen

NOTA: * BAO mag te ploetsen
* Geen blikken voedingspunten aan weep
* Kanten & blikken mag te ploetsen


PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT


1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/09/2020 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT, ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

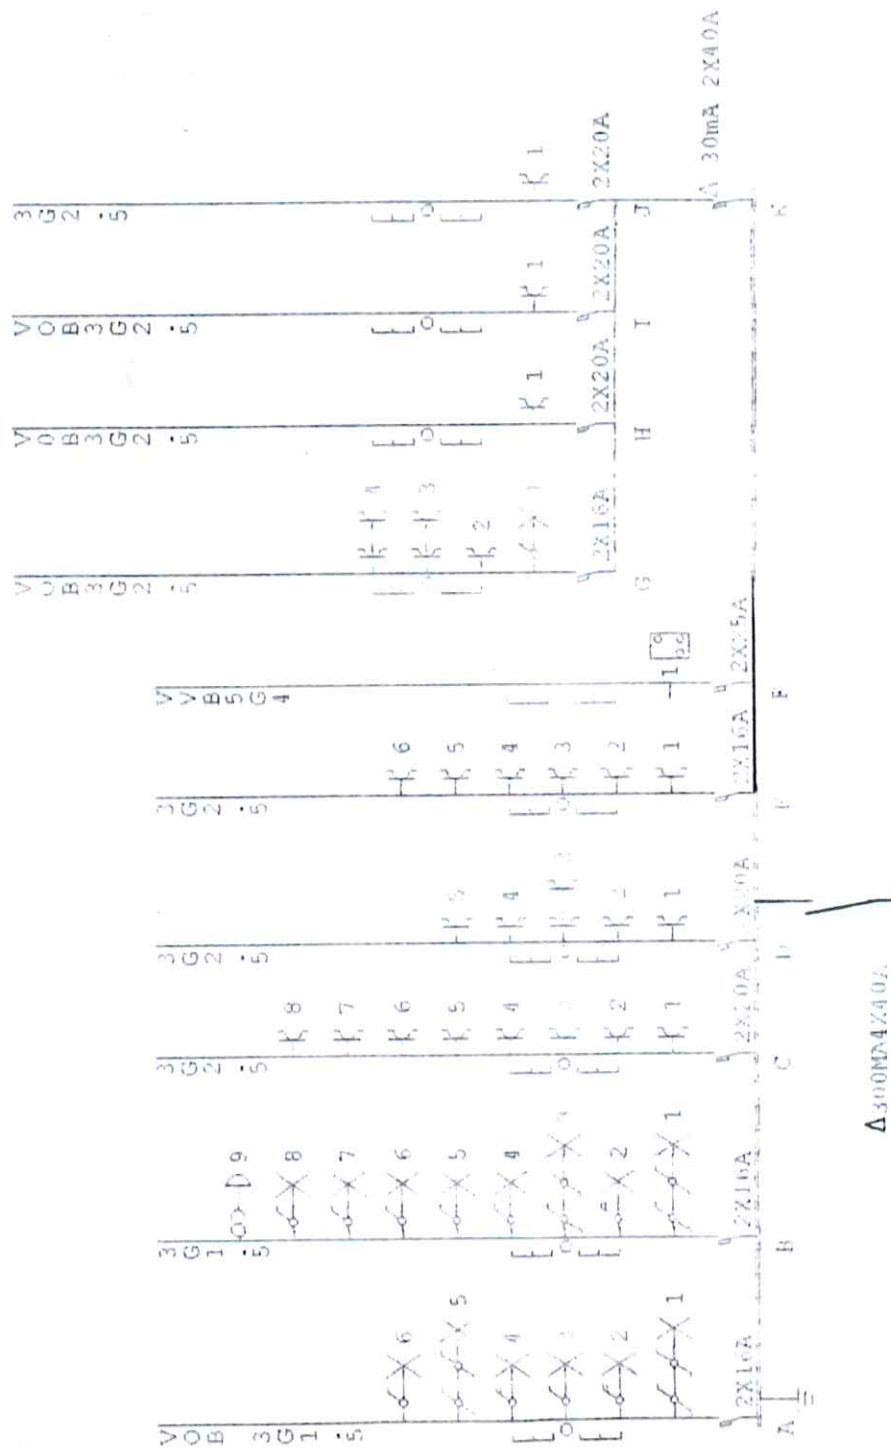

Handtekening Controleur	Handtekening Uitvoerder	KESTELYN - WIERINCX REEPSTRAAT LOT NR 2 BRAKEL - EVERBEEK
JA. VA. PO	Kampenhout 14	3140 Keerbergen 015/51.21.41 B7W.732.239.786



VERDIEPING
